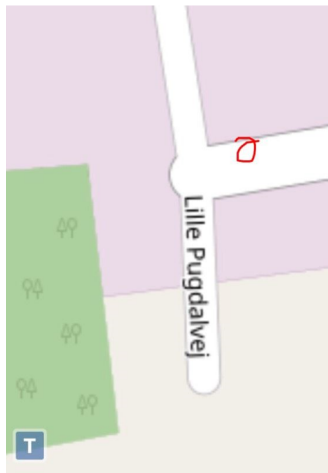


# Noter fra Vejsyn, Pugdalvejs forlængelse

## A.1 Project Data

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Project number:               | A111959                |
| Field note:                   | 2018_08_08_LTMU        |
| Date of field note:           | 8 Aug 2018 8:20:34 GMT |
| Field notes by:               | ltmu                   |
| Report generated date:        | 8 Aug 2018 8:50:42 GMT |
| Total number of observations: | 6                      |

## A.2 Noter

|                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observation number: | 1                                                                                                                                                                                                                                           |
| Observation(s):     | <div></div> <p>Foto placering, foto taget mod vest.</p> <div></div> |

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observation number: | 1                                                                                                                                               |
| Notes1:             | Fotoet viser den østligste tilslutning af den nye vejforlængelse. Der skal på området foretages en del rydning af beplantning ifm. entreprisen. |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observation number: | 2                                                                                                                                                                                                                                  |
| Observation(s):     |                                                                                                                                                  |
| Notes1:             | Der konstateres værende i omegnen af 10 beton rendestensbrønde på Bødkervej og Pugdal, hvor der skal graves ny kloak.<br>Det aftales ifm. synet, at der i udbuddet medtages udskiftning af rendestensbrøndene for Herning Kommune. |

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observation number: | 3                                                                                                                                                                                                        |
| Observation(s):     |                                                                                                                      |
| Notes1:             | Vejbredden konstateres værende ca. 10 meter. Den generelle regel er, at hvis der graves i veje på over 7 meters bredde, vil kommunen ikke kræve, at der foretages udskiftning af den del af asfalten der |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observation number: | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | <p>overstiger de 7 meters bredde, hvis samme ikke er beskadiget ifm. entreprisen.</p> <p>Det aftales, at der I projekteringen skal påregnes total udskiftning, da der skal nedgraves store ledninger I stor dybde. Det forventes derfor, at vejen vil blive strækt medtaget.</p> <p>Hvorvidt der skal skiftes I fuld bredde afhænger, af hvor meget der er ubeskadiget ifm. anlægsarbejderne.</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observation number: | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Observation(s):     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Notes1:             | <p>Det blev oplyst, at der kan forventes tre lags vejopbygning, som GAB0, ABB og slidlag.</p> <p>Herning Kommunen returnere med krav til vejopbygningen som helhed.</p> <p>Der skal I kloakentreprisen udelukkende medtages reetablering til og med GAB. Reetablering af ABB, slidlag og sribning foretages af Herning Kommune efterfølgende efter nærmere aftale med Herning Vand.</p> |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Observation number: | 5                                                                                    |
| Observation(s):     |  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observation number: | 5                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observation number: | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Notes1:             | <p>Det oplyses, at Herning kommune muligvis har tanker om, at omstrukturerer krydset Park Alle/Bødkervej til enten rundkørsel eller signalregulering. Der foreligger ikke endelige planer for same endnu, hvorfor der ikke kan tages højde for de til entreprisen.</p> <p>Heller anlæg mv. skal derfor reetableres.</p> |

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Observation number: | 6                                                                   |
| Observation(s):     |                                                                     |
| Notes1:             | <p>Herning kommune vil oplyse, ønske til lysning på udlagt GAB.</p> |
